計　画　工　程　表

工事番号　　東下第１０号

工 事 名　　船見処理区合流改善貯留施設設置工事

工期　自　令和4年3月3日

至　令和7年3月14日　　1108日間

福田・加賀田・丸運・北栄特定共同企業体

工種	種別 規格	数量 当初	数量 変更	単位
準備工		1.0	1.0	式
家屋調査	地元説明・家屋調査各協議	1.0	1.0	式
試掘工・舗装切断	試掘工、機雷探査他	1.0	1.0	式
管きょ工（推進）		1.0	1.0	式
泥水推進工	φ3000mm	461.0	465.0	m
管きょ工（鋼製さや管推進）		1.0	1.0	式
鋼製さや管推進工	φ600mm	1.0	1.0	式
特殊マンホール工		1.0	1.0	式
	No.1発進	1.0	1.0	式
	No.2到達	1.0	1.0	式
	No.3割込	1.0	1.0	式
立坑工		1.0	1.0	式
	No.1発進	1.0	1.0	式
	No.2到達	1.0	1.0	式
	No.3割込	1.0	1.0	式
地盤改良工		1.0	1.0	式
	No.1発進	1.0	1.0	式
	No.2到達	1.0	1.0	式
	No.3割込	1.0	1.0	式
付帯工		1.0	1.0	式
	舗装撤去工	1.0	1.0	式
	舗装復旧工	1.0	1.0	式
仮設工		1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	発進立坑	1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	到達立坑	1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	割込立坑	1.0	1.0	式
後片付け工		1.0	1.0	式
後片付け工		1.0	1.0	式
付帯工			1.0	式
圧送管設置工	発進側		1.0	式
空気抜き設備設置工	到達側		1.0	式

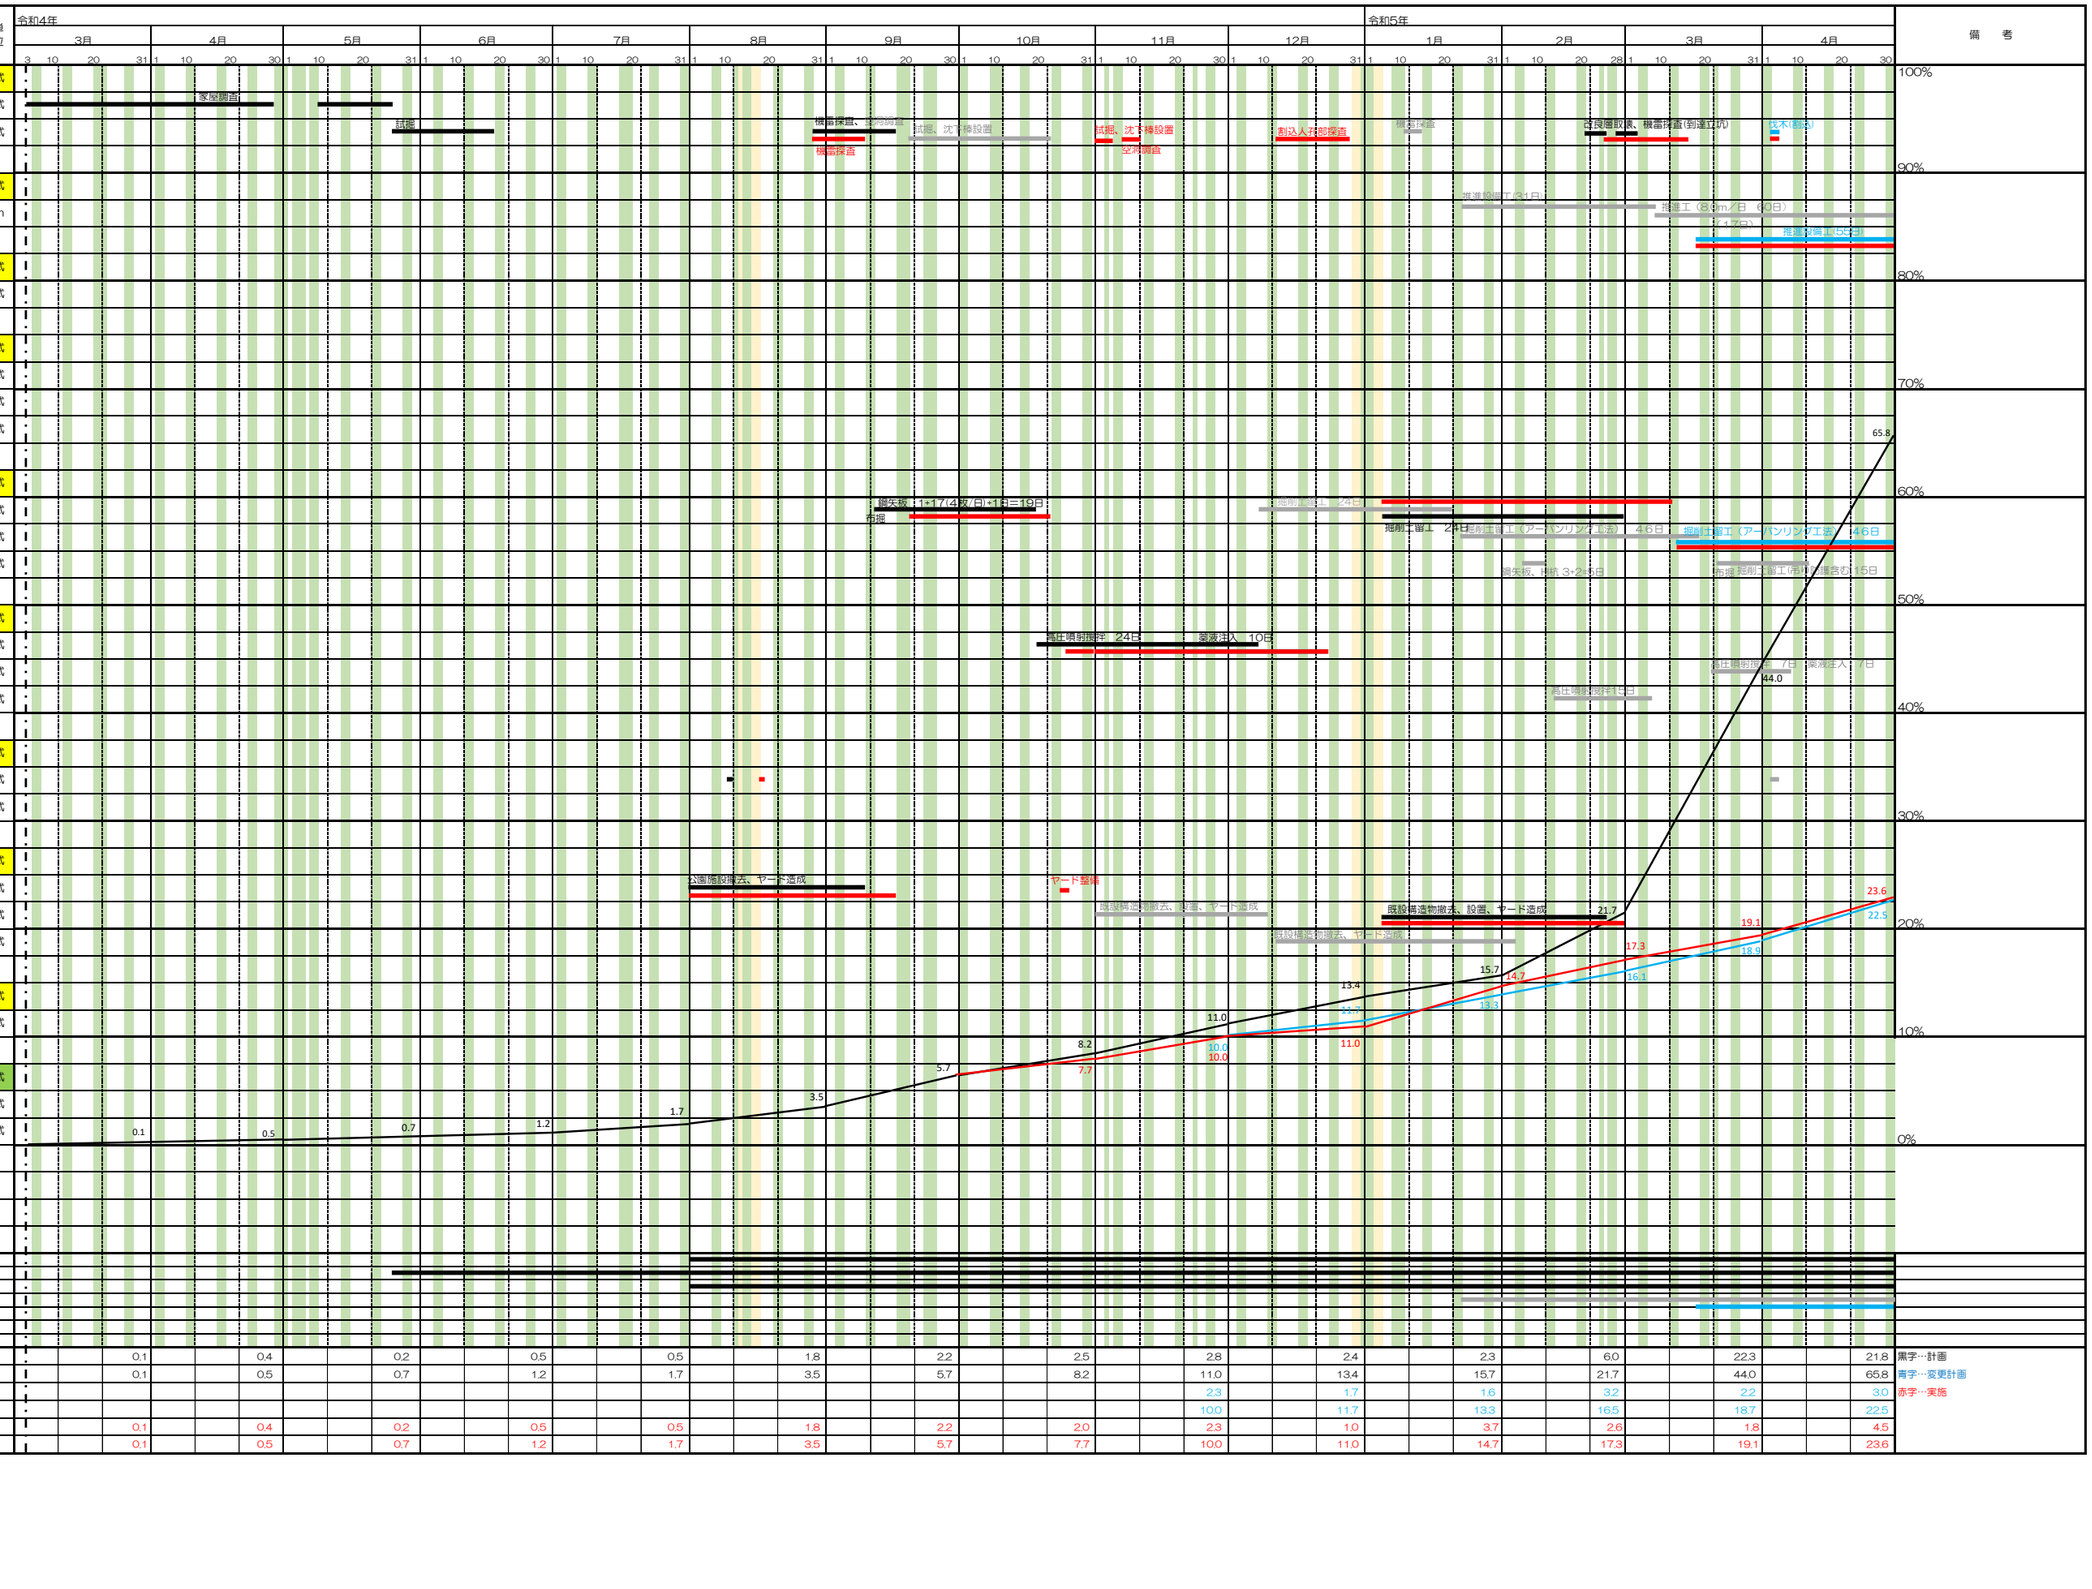
令和4年
令和5年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
家屋調査
試掘
機雷探査、試掘調査
試掘、沈下梁設置
機雷探査
試掘、沈下梁設置
空洞調査
割込人孔部探査
機雷探査
舗装撤去
舗装復旧工(24日)
推進工（8.8m／日（40日）
(41日)
推進作業員工(55日)
舗装復旧工(24日)
掘削、留工 24日
掘削、留工 24日
掘削土搬工（アーバンリング工法） 46日
掘削土搬工（アーバンリング工法） 46日
掘削、留工 24日
掘削土搬工（アーバンリング工法） 46日
掘削土搬工(アーバンリング工法) 46日
掘削、留工 24日
掘削土搬工(アーバンリング工法) 46日
掘削土搬工(アーバンリング工法) 46日
掘削土搬工(アーバンリング工法) 46

計　画　工　程　表

工事番号　　東下第１０号

工 事 名　　船見処理区合流改善貯留施設設置工事

工期　自　令和4年3月3日

至　令和7年3月14日　1108日間

福田・加賀田・丸運・北栄特定共同企業体

工種	種別 規格	数量 当初	数量 変更	単位
準備工		1.0	1.0	式
家屋調査	地元説明・家屋調査各協議	1.0	1.0	式
試掘工・舗装切断	試掘工、機雷探査他	1.0	1.0	式
管きょ工（推進）		1.0	1.0	式
泥水推進工	φ3000mm	461.0	465.0	m
管きょ工（鋼製さや管推進）		1.0	1.0	式
鋼製さや管推進工	φ600mm	1.0	1.0	式
特殊マンホール工		1.0	1.0	式
	No.1発進	1.0	1.0	式
	No.2到達	1.0	1.0	式
	No.3割込	1.0	1.0	式
立坑工		1.0	1.0	式
	No.1発進	1.0	1.0	式
	No.2到達	1.0	1.0	式
	No.3割込	1.0	1.0	式
地盤改良工		1.0	1.0	式
	No.1発進	1.0	1.0	式
	No.2到達	1.0	1.0	式
	No.3割込	1.0	1.0	式
付帯工		1.0	1.0	式
	舗装撤去工	1.0	1.0	式
	舗装復旧工	1.0	1.0	式
仮設工		1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	発進立坑	1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	到達立坑	1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	割込立坑	1.0	1.0	式
後片付け工		1.0	1.0	式
後片付け工		1.0	1.0	式
付帯工			1.0	式
圧送管設置工	発進側		1.0	式
空気抜き設備設置工	到達側		1.0	式

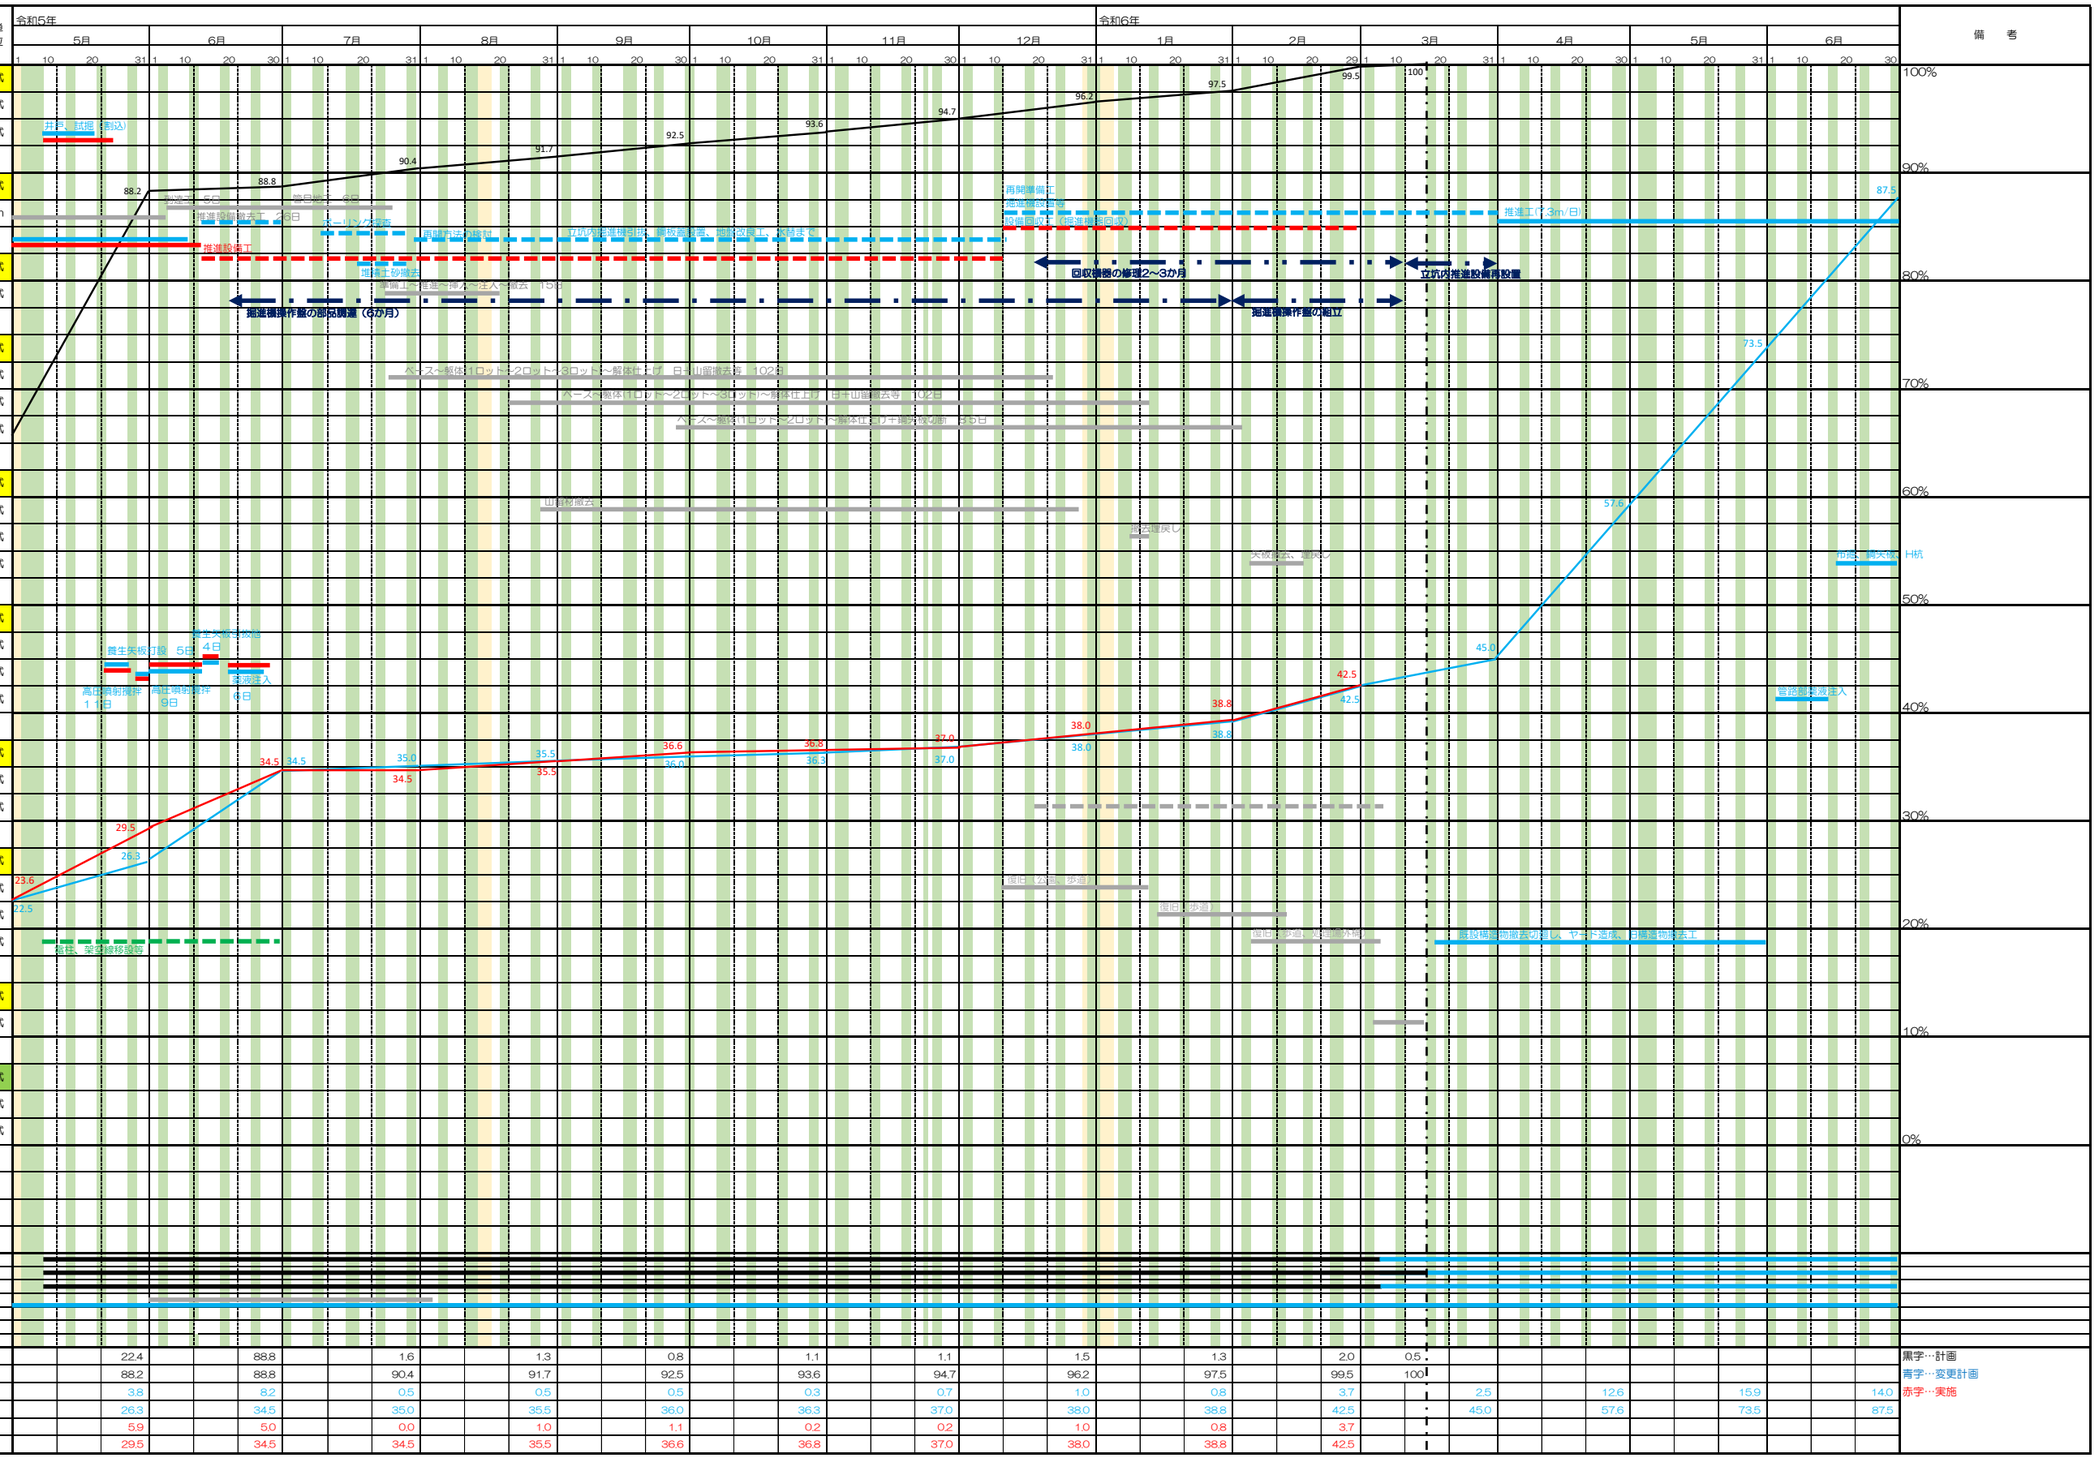

		1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	29	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30
計画	月				22.4				88.8				1.6				1.3				0.8				1.1				1.1				1.5				1.3				2.0	0.5														
	累計				88.2				88.8				90.4				91.7				92.5				93.6				94.7				96.2				97.5				99.5	100														
変更	月				3.8				8.2				0.5				0.5				0.5				0.3				0.7				1.0				0.8				3.7				2.5				12.6				15.9				14.0
	累計				26.3				34.5				35.0				35.5				36.0				36.3				37.0				38.0				38.8				42.5				45.0				57.6				73.5				87.5
実施	月				5.9				5.0				0.0				1.0				1.1				0.2				0.2				1.0				0.8				3.7															
	累計				29.5				34.5				34.5				35.5				36.6				36.8				37.0				38.0				38.8				42.5															

黒字…計画
青字…変更計画
赤字…実施

計　画　工　程　表

工事番号　　東下第１０号

工 事 名　　船見処理区合流改善貯留施設設置工事

工期　自　令和4年3月3日

至　令和7年3月14日　　1108日間

工　種	種　別 規　格	数　量 当　初	数　量 変　更	単位
準備工		1.0	1.0	式
家屋調査	地元説明・家屋調査各協議	1.0	1.0	式
試掘工・舗装切断	試掘工、機雷探査他	1.0	1.0	式
管きょ工（推進）		1.0	1.0	式
泥水推進工	φ3000mm	461.0	465.0	m
管きょ工（鋼製さや管推進）		1.0	1.0	式
鋼製さや管推進工	φ600mm	1.0	1.0	式
特殊マンホール工		1.0	1.0	式
	№1発進	1.0	1.0	式
	№2到達	1.0	1.0	式
	№3割込	1.0	1.0	式
立坑工		1.0	1.0	式
	№1発進	1.0	1.0	式
	№2到達	1.0	1.0	式
	№3割込	1.0	1.0	式
地盤改良工		1.0	1.0	式
	№1発進	1.0	1.0	式
	№2到達	1.0	1.0	式
	№3割込	1.0	1.0	式
付帯工		1.0	1.0	式
	舗装撤去工	1.0	1.0	式
	舗装復旧工	1.0	1.0	式
仮設工		1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	発進立坑	1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	到達立坑	1.0	1.0	式
作業ヤード設置工	割込立坑	1.0	1.0	式
後片付け工		1.0	1.0	式
後片付け工		1.0	1.0	式
付帯工			1.0	式
圧送管設置工	発進側		1.0	式
空気抜き設備設置工	到達側		1.0	式

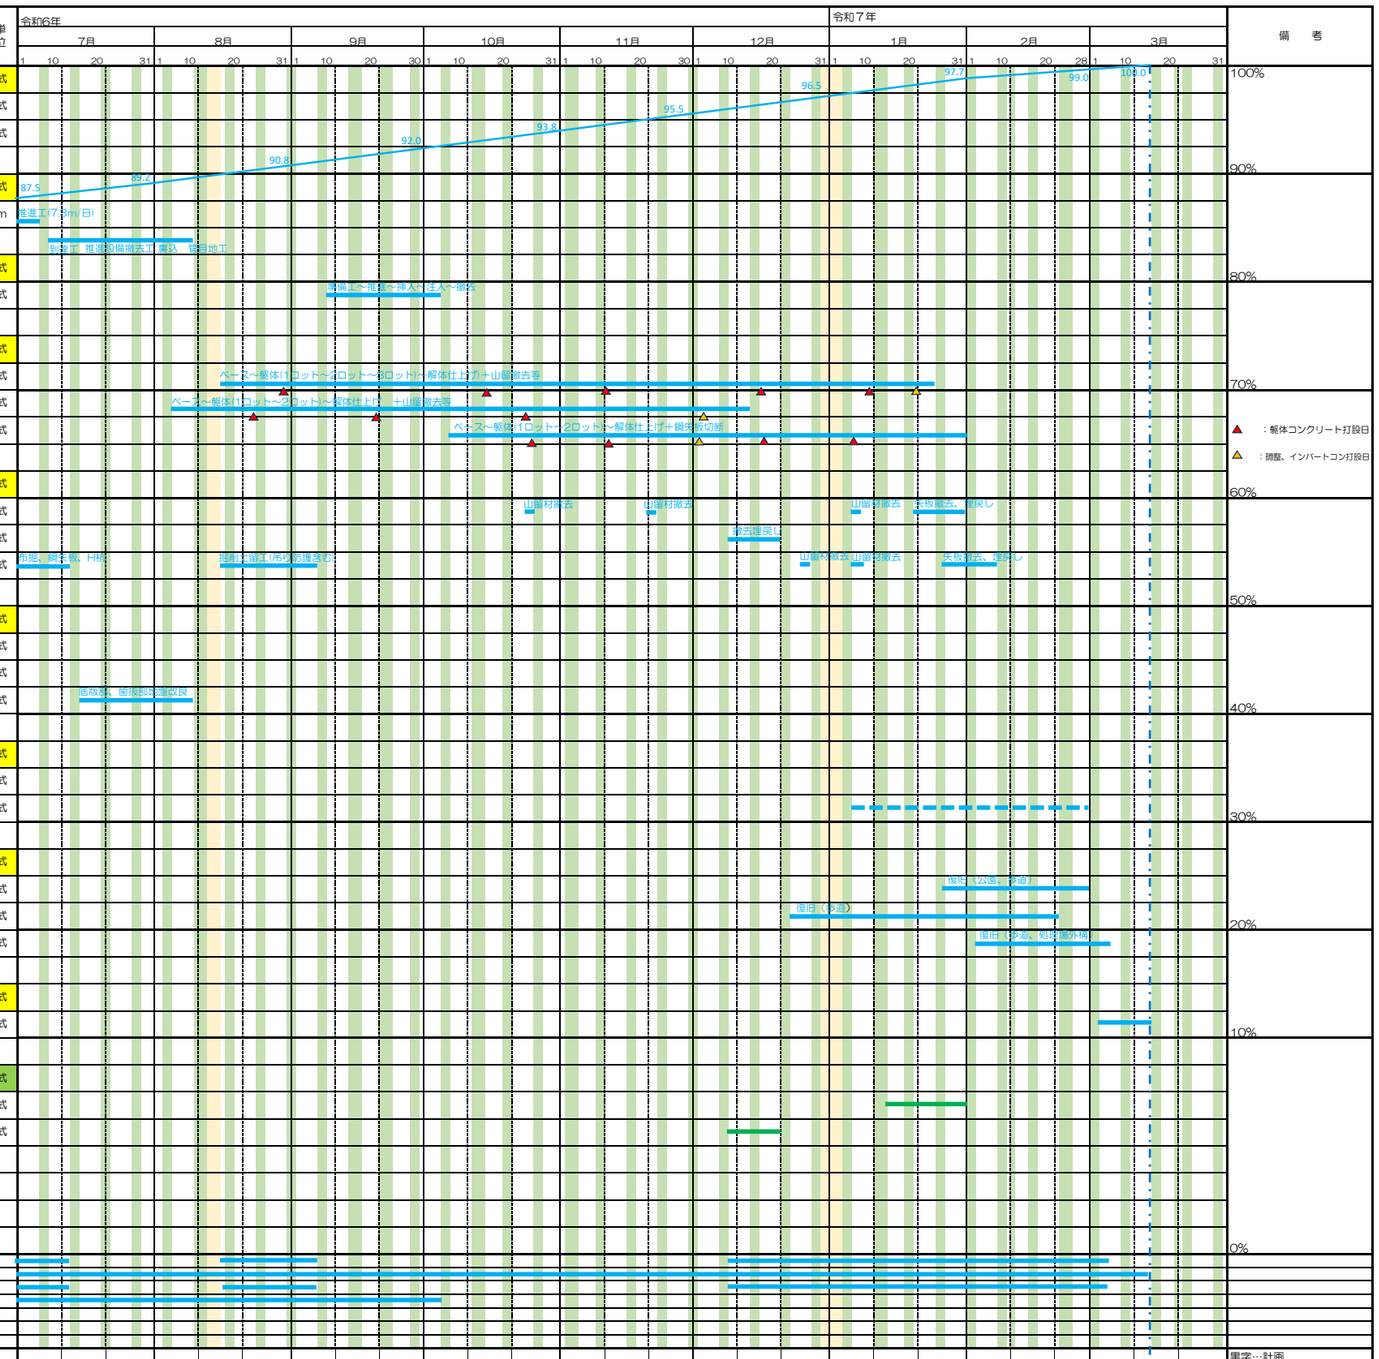

主要機械計画
バックホウ
移動式クレーン
ダンプトラック
推進設備

				令和6年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月
		計画	月									
			累計									
		変更	月	1.7	1.6	1.2	1.8	1.4	1.3	1.2	1.3	1.0
			累計	89.2	90.8	92.0	93.8	95.2	96.5	97.7	99.0	100.0
		実施	月									
			累計									

備　考
100%
90%
80%
70%
▲：躯体コンクリート打設日
△：調整、インバートコン打設日
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
黒字…計画
青字…変更計画
赤字…実施
